Оптимизация процесса подготовки воспитателей к рабочей смене

- **МБДОУ ДС №27 "Семицветик" г.Юрги**

КУЗБАСС
время быть первыми

Паспорт проекта

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
_____ Н.Г.Кадочникова

Паспорт лин-проекта
МБДОУ ДС №27 «Семицветик» г.Юрги
Оптимизация процесса подготовки воспитателя к рабочей смене.
(название лин-проекта)

Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта

Заказчик: Кадочникова Н.Г., заведующий МБДОУ ДС №27 «Семицветик» г.Юрги
Процесс: подготовка воспитателя ДОУ к рабочей смене в соответствии с ежедневным планированием ВОП.
Границы процесса: от подбора учебно – методического материала до окончания подготовки раздаточного материала.
Руководитель проекта Т.Ю.Рослова, старший воспитатель
Команда проекта А.М. Федорова, воспитатель, Т.А. Шулаякова, воспитатель, О.Н. Матрошилова, зам по БОП, учитель-логопед

Блок 2. Обоснование выбора

- Длительный процесс подготовки воспитателя к рабочей смене.
- Отсутствие самоорганизации.
- Временные потери на поиск и подбор учебно – методического материала.
- Передвижение между кабинетами, общение с коллегами для уточнения и корректировки информации.

Блок 3. Цели и эффекты

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат воспитателя на подготовку к рабочему дню.	1 час	40 минут

Эффекты:
- Экономия времени.
- Повышение уровня удовлетворенности педагогических работников качеством подготовки к рабочей смене.
- Повышение профессиональных навыков педагогов ДОУ.

Блок 4. Сроки

1. Согласование паспорта лин-проекта – 12.09.2021
2. Картирование текущего состояния – с 13.09.2021 по 19.09.2021
3. Анализ проблем и потерь – с 20.09.2021 по 23.09.2021
4. Составление карты целевого состояния – с 26.09.2021 по 28.09.2021
5. Разработка плана мероприятий – с 29.09.2021 по 03.10.2021
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 05.10.2021
7. Внедрение улучшений – с 05.10.2021 по 05.12.2021
8. Мониторинг результатов – с 05.12.2021 по 16.12.2021
9. Закрытие лин-проекта – 23.12.2021
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – январь 2022

Команда проекта

Рослова Татьяна Юрьевна, старший воспитатель – руководитель проекта

Федорова Александра Михайловна, воспитатель

Шулаякова Татьяна Анатольевна, воспитатель

Такленок Ольга Владимировна, педагог - психолог

Пирамида проблем

- Длительный процесс подготовки воспитателя к рабочей смене
- Отсутствие самоорганизации
- Временные потери на поиск и подбор учебно – методического материала
- Передвижение между кабинетами, общение с коллегами для уточнения и корректировки информации

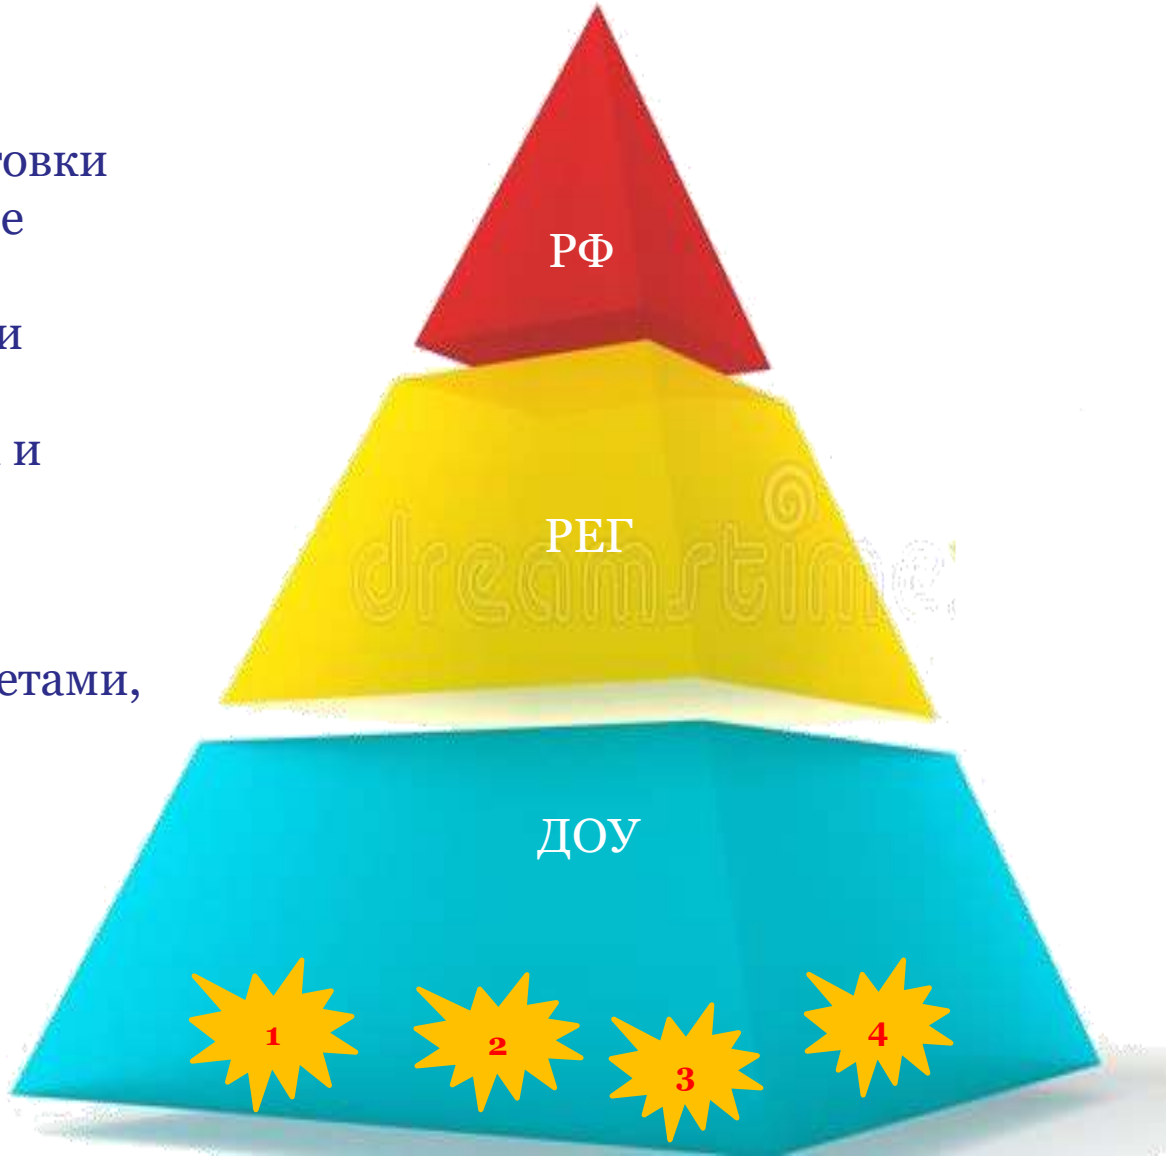

Карта состояния текущего процесса

«Оптимизация процесса подготовки воспитателей к рабочей смене» на 15.09.2021

ВХОД

ШАГ 1

Рабочее место воспитателя

Поиск учебно-методических материалов: конспекты, сценарии на бумажных носителях (в ящиках, на рабочих столах, на полках шкафов, файлы на компьютере).

25 мин.

1 3 4

ШАГ 2

Рабочее место воспитателя

Поиск материалов и оборудования : Демонстрационный и раздаточный материал (на полках шкафов, мультимедийные презентации, файлы на компьютере)

20 мин.

1 3 4

ШАГ 3

Рабочее место воспитателя

Отбор расходных материалов, инвентаря: бумага, клей, краски, карандаши; кисти, ножницы, доски для лепки. (на полках шкафа)

15 мин.

1 2 3

ШАГ 4

Рабочее место воспитателя

Подготовка раздаточного материала и оборудования: карточки, тетради, листы, материал для лепки, аппликации. (в ящиках, на полках шкафа)

25 мин.

1 2 3

ВЫХОД

ВПП (время протекания процесса) - до 85 мин.

Анализ проблем

Устранение ежей – решение проблем

Проблема	Решение проблемы	Экономия времени
Длительный процесс подготовки воспитателя к рабочей смене	Систематизация мест хранения, поддержание порядка на полках, в шкафах, в гаджетах. Инвентаризация материалов и оборудования. Совместное с напарником планирование педагогического взаимодействия с детьми.	до 20 минут
Отсутствие самоорганизации	Размещение дидактических и демонстрационных материалов и оборудования в поле зрения воспитателя. Перевод данных в электронную форму. Размещение материалов и оборудования в строго отведенных местах.	до 10 мин
Временные потери на поиск и подбор учебно-методического материала	Переход к электронному хранению учебно-методического материала. Систематизация по образовательным областям, по воспитательным направлениям и т.п.	до 5 мин
Передвижение между кабинетами, общение с коллегами для уточнения и корректировки информации	Стандартизация размещения дидактических и демонстрационных материалов и оборудования. Визуализация мест хранения (цветные маркеры, папки, указатели)	до 20 минут

Карта состояния текущего процесса
«Оптимизация процесса подготовки воспитателей к рабочей смене» на 15.12.2021

ВХОД

ШАГ 1

Рабочее место воспитателя

Поиск учебно-методических материалов: конспекты, сценарии на бумажных носителях (в ящиках, на рабочих столах, на полках шкафов, файлы на компьютере).

15 мин.

ШАГ 2

Рабочее место воспитателя

Поиск материалов и оборудования : Демонстрационный и раздаточный материал (на полках шкафов, мультимедийные презентации, файлы на компьютере)

10 мин.

ШАГ 3

Рабочее место воспитателя

Отбор расходных материалов, инвентаря: бумага, клей, краски, карандаши; кисти, ножницы, доски для лепки. (на полках шкафа)

10 мин.

ШАГ 4

Рабочее место воспитателя

Подготовка раздаточного материала и оборудования: карточки, тетради, листы, материал для лепки, аппликации. (в ящиках, на полках шкафа)

15 мин.

ВЫХОД

ВПП (время протекания процесса) - до 50 мин.

Достигнутые результаты

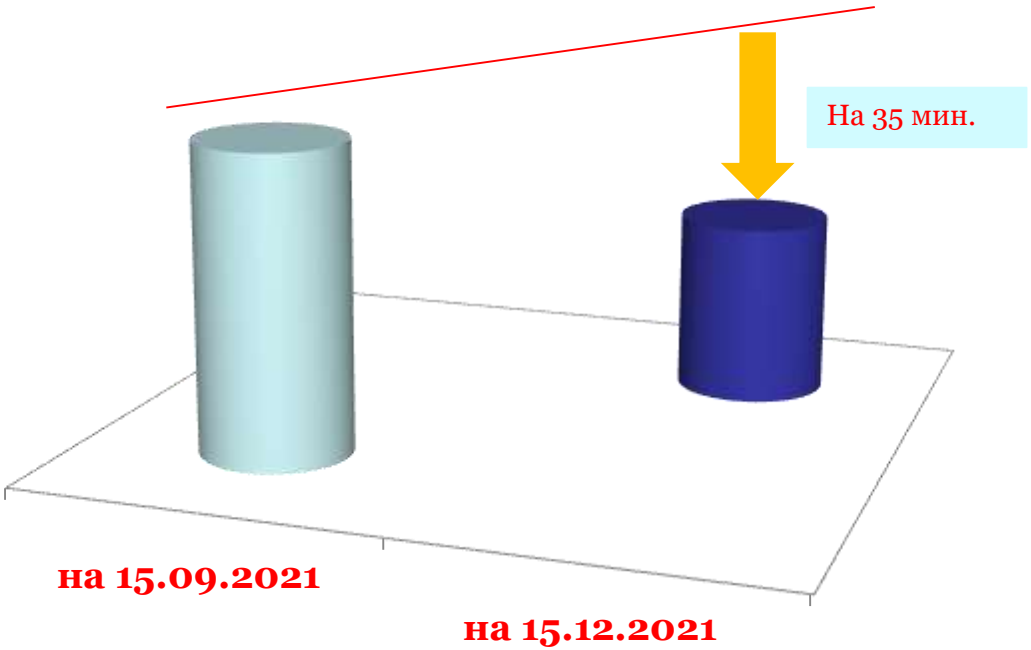

Экономия времени

подготовки к рабочей смене (занятиям)

до 35 минут
